


土浦市長 殿

アスベスト有無に関する事前調査結果報告書

貴社より委託を受けたアスベスト有無に関する事前調査結果は、下記に記載した通りであることを報告いたします。

(会 社 名) 株式会社 環境測定サービス
(代表者名) 代表取締役 黒羽 敦
(住 所) 茨城県水戸市石川 4 丁目 3896・3



調査の種類	1. 石綿則第 3 条に基づく事前調査	2. その他の事前調査
調査期間	令和 6 年 10 月 31 日 ~ 令和 6 年 11 月 8 日	
調査責任者	(氏名) 大津 満秀 (「(社) 日本石綿協会認定 アスベスト診断士」資格保有者は下欄に記載)	
	(一般建築物石綿含有建材調査者) 第 2100063 号	
	(所属部署) 本社 環境計測部 Tel 029-257-2601 Fax 029-257-2602	
調査実施者	(氏名) 大津 満秀	
	(氏名) 遠藤 湧也	

対象物件 概要	工事名	土浦市青少年の家解体工事に伴う石綿含有建材事前調査業務委託		
	施設名	① 本館/不明・S53 年増築	文書記録	有
	竣工年	地上 2 階 (719 m ²) RC 造		
	規模	② 研修室/S53 年		有
	建物構造	地上 1 階 (297 m ²) S 造		
		③ 渡り廊下/不明		有
		地上 1 階 (17 m ²) W 造		
		④ 駐輪場/S60 年		無
		地上 1 階 (16 m ²) S 造		
		⑤ 外部トイレ/S54 年		無
		地上 1 階 (15 m ²) CB 造		
		⑥ 機械室/不明		無
		地上 1 階 (10 m ²) RC 造		
		⑦ 外部トイレ/S61 年		有
		地上 1 階 (30 m ²) CB 造		
		⑧ 倉庫/不明		無
		地上 1 階 (5 m ²) S 造		
		⑨ 倉庫/不明		無
		地上 1 階 (4 m ²) S 造		
		⑩ 倉庫/不明		無
		地上 1 階 (3 m ²) S 造		

対象物件 概要	施設名 竣工年 規模 建物構造	⑪ 用務員宿舎/S63 年 地上 1 階 (13 m ²) S 造	文書記録	無
	⑫ 倉庫/不明 地上 1 階 (12 m ²) S 造	無		
	⑬ 倉庫/不明 地上 1 階 (12 m ²) S 造	無		
	⑭ ゴミ置場/不明 地上 1 階 (4 m ²) CB 造	無		
	⑮ 野外炊事場/S61 年 地上 1 階 (39 m ²) W 造	有		
	⑯ シャワー室/不明 地上 1 階 (25 m ²) CB 造	無		
	⑰ 倉庫/不明 地上 1 階 (6 m ²) S 造	無		
	⑱ 倉庫/不明 地上 1 階 (15 m ²) S 造	無		
	⑲ 屋外教室兼食堂/不明 地上 1 階 (70 m ²) W 造	有		
	⑳ キャビン/S60 年 地上 2 階 (13 m ²) S 造	無		
所在地	茨城県土浦市乙戸 1099			
分類	建築物		工作物	
用途 (複数選択可)	事務所・工場／倉庫・娯楽施設 学校／体育館・公共施設・店舗 特殊建築物・運輸関連施設・ 戸建住宅・共同住宅		電力・石油/ガス・ 化学プラント ボイラー・焼却施設 その他 ()	
調査対象材料	(複数選択可) 吹付け材・保温材・断熱材・耐火被覆材・成形材・その他 ()			
調査方法	(複数選択可) 文書調査・現場調査・分析調査			
調査結果	1. 建築物、工作物の一部にレベル 1 調査対象材料の使用有 2. 建築物、工作物の一部にレベル 2 調査対象材料の使用有 3. 建築物、工作物の一部にレベル 3 調査対象材料の使用有			

調査結果の概要

1. 特記事項

(1) 書面調査及び目視調査による結果

1) 書面調査による結果

設計図書等からは石綿含有製品と思われる製品名が散見されました。(岩綿吹付、蛭石吹付、アクリルリシン吹付、カポスタック(煙突内部)、長尺シート(ロンリウム)、石膏ボード(ジプトーン)、大平板、防水シート、コロニアル葺き、アスファルトルーフィング)の表記がありました。(煙突のカポスタックについては分析済み。含有・有)

2) 現地目視調査による結果

アスベスト含有建材は発じんの度合いにより「レベル1～3」に分類されています。最も発じん度合いが高いのはレベル1です。各レベル相当のアスベストを含有する可能性がある建材について目視調査で確認いたしました。

調査で確認した建材について 2. レベル別使用建材調査結果に示します。

レベル1の蛭石吹付が本館の一部の天井に確認されましたが、設計図書に記載のあった同じくレベル1の岩綿吹付は除去済でした。またレベル2の保温材が一部点検口内部(天井裏)、床下の配管、第二会議室、機械室内部で確認され、同じくレベル2の断熱材が⑦外部トイレ、用務員宿舎、シャワー室の軒裏で確認されました。前述したレベル1及びレベル2以外にもレベル3の建材が各所に確認されました。

アスベスト使用不明の建材等につきましては、施工時期等からアスベストが含有の可能性があり、又アスベストの未含有の証明が出来ない為ほとんどの建材について要調査・分析と判断致しました。

また、アスベスト使用不明の建材の内、作業範囲が狭い箇所や、採取困難な場所にあるものに関して「みなし有」とし、アスベストが使用されているとみなし、分析不要といたしました。※現場調査におきましては目視可能な範囲で調査致しました。

(2) アスベスト使用及び現状での飛散の有無

設計図書及び現地調査結果の詳細を建築物石綿含有建材調査結果表に示します。

アスベストの含有の可能性のある建材等(要調査・分析)に蛭石吹付が確認されましたが、損傷欠損が局所的で拡大が見られず、その周辺は下地にしっかり固着されています。その他の建材は、発じんによる暴露の恐れは少ないと考えられ、特に措置を要する状況にはありませんでした。

※保温材等は点検口内部(天井裏)であったり、養生が施されているので飛散性は少ないと考えられます。(⑦外部トイレ・用務員宿舎・シャワー室の軒裏の被覆が剥がれ少量の断熱材が剥き出しになっており、飛散性は少ないと考えられますが、リスクを軽減する為には養生の必要があると思われます。)

(3) 当該建物等の管理に留意する必要がある事項

今後、改修や増築、解体等を実施する場合は以下の点に留意が必要となります。

- ① 建築物石綿含有建材調査結果表及び別紙の使用建材写真集に記載した、分析調査必要建材は、未確認の建材については分析調査による確認を行うことが望ましい。
- ② 分析調査を行わない場合はボード類の裏面の品番確認を行いアスベスト含有建材でないかの確認を実施する。
- ③ アスベスト使用が不明な建材についてはアスベスト含有有無を確認するまでは、破壊等を行わない。

2. レベル別使用建材調査結果

目視調査でレベル1～レベル3相当の石綿含有の可能性があったとした建材についてレベルごとに示します。

レベル1

棟名	部屋名	部位	建材名
本館 1F	玄関	天井	蛭石吹付
	玄関ホール	天井	蛭石吹付
	階段	天井	蛭石吹付
	廊下	天井	蛭石吹付
	中廊下	天井	蛭石吹付
本館 2F	階段	天井	蛭石吹付
	廊下	天井	蛭石吹付

レベル2

棟名	部屋名	部位	建材名
本館 1F	宿泊室、指導員室	床下	床下配管 保温材
	第二会議室	点検口	排水管保温材白巻
	第二会議室	室内	排水管保温材白巻
	宿泊室、指導員室	点検口	排水管保温材白巻
	男子洗面所 入口	点検口	排水管保温材銀巻 排水管保温材白巻
本館外部	—	煙突	カポスタック
附属建物	機械室	壁	保温材
	機械室	天井	保温材
	外部トイレ⑦外部	屋根・軒裏	発泡ポリエチレン
	用務員宿舎	軒裏	断熱材
	シャワー室	軒裏	断熱材

レベル3

棟名	部屋名	部位	建材名
本館 1 階	玄関ホール	床	ポリウム ピンク
	階段	床	ポリウム ピンク
	第二会議室	天井	石膏ボード (旧)
	食堂	床	ポリウム 奥 (増築部) 明るいグレー, ポリウム 手前 グレー
	食堂	天井	石膏ボード (旧) 点検口内部スタイロフォーム
	宿泊室①	床	ポリウム ピンク
	宿泊室①	天井	石膏ボード (旧)
	宿泊室②	床	ポリウム ピンク
	宿泊室②	天井	石膏ボード (旧)
	宿泊室③	床	ポリウム ピンク

棟名	部屋名	部位	建材名
本館 1 階	宿泊室③	天井	石膏ボード (旧)
	指導員室①	床	ロリウム ピンク
	指導員室①	天井	石膏ボード (旧)
	指導員室②	床	ロリウム ピンク
	指導員室②	天井	石膏ボード (旧) 点検口内部パッキン
	事務室	壁	プラスター塗※一部ラスボード下地
	事務室	天井	石膏ボード (旧)
	男子脱衣室	床	ロリウム ピンク
	男子便所	天井	ボード
	男子洗面所	天井	ボード
	厨房	その他	タクトパッキン
	ボイラー室	その他	配管パッキン白 配管パッキン肌色
	廊下	床	ロリウム ピンク
	中廊下	床	ロリウム ピンク
	1 階増築部廊下	壁	石膏ボード
	1 階増築部廊下	天井	ボード
	女子脱衣室	床	ロリウム 黄色
	女子脱衣室	天井	ボード
	女子浴室	天井	ボード
	女子便所	天井	ボード
本館 2 階	階段	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑤	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑤	天井	石膏ボード (新)
	宿泊室⑥	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑥	天井	石膏ボード (新)
	宿泊室⑦	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑦	天井	石膏ボード (新)
	宿泊室⑧	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑧	天井	石膏ボード (旧)
	宿泊室⑩	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑩	天井	石膏ボード (旧)
	宿泊室⑪	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑪	天井	石膏ボード (旧)
	宿泊室⑫	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑫	天井	石膏ボード (新)
	宿泊室⑬	床	ロリウム グレー
	宿泊室⑬	天井	石膏ボード (新)
	宿泊室	点検口	点検口内部スタイロフォーム

棟名	部屋名	部位	建材名
本館 2 階	廊下	床	ポリウム グレー
本館外部	—	1 階部分 屋根	防水シート
	—	2 階部分 屋根	防水シート
本館外部	—	食堂増築部 屋根	防水シート
	—	女子洗面所増築部屋根	防水シート
	—	外壁	外壁塗材
	—	食堂増築部 外壁	外壁塗材
研修室	玄関	天井	石膏ボード (旧)
	廊下・ロビー	床	P タイル (濃い)
	廊下・ロビー	床	P タイル (薄い)
	廊下・ロビー	天井	石膏ボード (新) 石膏ボード (旧)
	廊下・ロビー	その他	天井裏内部ボード
	集会室	天井	石膏ボード (新)
	物置・倉庫	天井	石膏ボード (旧)
	男子洗面所	天井	石膏ボード (旧) 天井裏内部ボード
	男子便所	天井	大平板 5.0
	女子洗面所	天井	石膏ボード (旧)
	女子便所	天井	大平板 5.0
研修室外部	—	屋根	クボタカラーベストコロニアル
	—	外壁	ALC 板 (軽量気泡コンクリート) アクリルシ吹付、一部ラスモルタル
	—	柱型	アクリルシ吹付
附属建物	渡り廊下	床	ポリウム 赤色
	外部トイレ⑤ 外部	外壁	外壁塗材
	外部トイレ⑤ 内部	天井	石膏ボード
	機械室	屋根	外壁塗材
	機械室	外壁	外壁塗材
	外部トイレ⑦外部	外壁	アクリルシ吹付
	外部トイレ⑦内部	壁	アクリルシ吹付 シーラー
	外部トイレ⑦内部	天井	石膏ボード
	用務員宿舍	床	長尺シート
	倉庫⑫	壁	石膏ボード
	倉庫⑬	壁	石膏ボード
	野外炊事場	屋根	コロニアル葺き アスファルトルーフィング 22K
	シャワー室	外壁	外壁塗材
	シャワー室 (男子)	天井	ボード
	シャワー室 (女子)	天井	ボード

棟名	部屋名	部位	建材名
附属建物	シャワー室（脱衣室）	天井	石膏ボード
	屋外教室兼食堂	屋根	コロニアル葺き アスファルトルーフィング [®] 22K
	キャビン	屋根	コロニアル

備考：各レベル区分に該当する石綿含有建材は下記の通りです。

レベル 1	①吹付け石綿	レベル 2	⑤石綿含有保温材（吹付け材を除く）
	②石綿含有吹付けロックウール		⑥石綿含有断熱材（吹付け材を除く）
	③石綿含有吹付けパーミキュライト（蛭石）		⑦石綿含有耐火被覆材（吹付け材を除く）
	④石綿含有吹付けパーライト	レベル 3	⑧その他の石綿含有建材（成形板等）
		レベル外	⑨上記のレベル以外の石綿含有製品をいい、これに石綿含有シール材、摩擦材等が該当する。

3. 分析調査の検体数について

レベル 1～レベル 3 相当の石綿含有の可能性のある建材について石綿含有の有無を判定するには、分析調査によります。これらについて、分析にあたり必要な検体数を下表に示します。

① 本館 竣工年不明 ※増築部は 1978 年（分析 19 検体、**みなし含有候補 7 検体**）

	部屋名	階	場所	建材
1	本館外部	1	屋根	防水シート
2	本館外部	2	屋根	防水シート （色違い部分あり）
3	外部（増築；女子洗面所等）	1	屋根	防水シート
4	外部（増築；食堂）	1	屋根	防水シート
5	外部	1	外壁	外壁塗材
6	外部（増築；食堂）	1	外壁	外壁塗材
7	玄関	1	天井	蛭石吹付
	玄関ホール	1		
	廊下	1		
	廊下	2		
	階段	1		
	階段	2		
8	中廊下	1	床	ロンリウム （色；グレー）
	宿泊室No.5,6,7,8,10,11,12,13	2		
	階段	2		
	廊下	2		
9	食堂	1	天井	新；石膏ボード
	宿泊室No.5,6,7,12,13	2		
10	宿泊室No.5 食堂	2 1	点検口内部	スタイロフォーム
11	宿泊室No.1,2,3	1	床	ロンリウム （色；ピンク）
	指導員室No.1,2	1		

	部屋名	階	場所	建材
11	階段	1	床	ロンリウム (色 ; ピンク)
	廊下	1		
	中廊下	1		
	男子脱衣室	1		
	玄関ホール	1		
12	宿泊室No.1,2,3	1	天井	旧 ; 石膏ボード (ジプトーン)
	指導員室No.1,2	2		
	第二会議室	1		
	食堂	1		
	事務室	1		
	宿泊室No.8,10,11	2		
13	指導員室No.2	2	点検口内部	パッキン
14	食堂増築部分	1	床	ロンリウム (色 ; 明るいグレー)
15	事務室	1	壁	ラスボード
16	男子洗面所入口	1	点検口内部配管	保温材 (銀)
17	男子洗面所入口	1	点検口内部配管	保温材 (白)
	宿泊室No.2	1	室内	
	第二会議室	1		
	第二会議室	1		
18	宿泊室No.1,2,3	1	床下配管保温材	保温材
	指導員室No.1,2	1		
19	厨房	1	ダクト	パッキン
20	煙突	1	外部	カポスタック ※分析済み 含有
21	ボイラー室	1	配管	パッキン (色 ; 白)
22	ボイラー室	1	配管	パッキン (色 ; 肌色)
23	男子洗面所	1	天井	ボード
	男子便所			
24	廊下 (増築 ; 女子洗面所等)	1	天井	ボード
25	女子脱衣室 (増築 ; 女子洗面所等)	1	天井	ボード
	女子浴室 (増築 ; 女子洗面所等)	1		
26	女子便所 (増築 ; 女子洗面所等)	1	天井	ボード

② 研修室 竣工年 1978 年 (分析 6 検体、みなし含有候補 2 検体)

	部屋名	階	場所	建材
1	外部	1	屋根	コロニアル葺き
2	外部		外壁	アクリルリシン
3	廊下・ロビー	1	天井	新 ; 石膏ボード
	集会室	1		

	部屋名	階	場所	建材
4	玄関	1	天井	旧；石膏ボード
	廊下・ロビー	1		
	物置・倉庫	1		
	男子洗面所	1		
	女子洗面所	1		
5	廊下・ロビー	1	床	P タイル（薄）
6	廊下・ロビー	1	床	P タイル（濃）
7	男子洗面所	1	天井破損部分	ボード
8	男子便所	1	天井	大平板
	女子便所			

③ 渡り廊下 竣工年不明（分析 0 検体、みなし含有候補 1 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	渡り廊下	1	床	ロンリウム（色；赤）

④ 駐輪場 竣工年不明

分析対象無し

⑤ 外部トイレ 竣工年 1979 年（分析 1 検体、みなし含有候補 1 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	⑤外部トイレ 内部	1	天井	石膏ボード
2	⑤外部トイレ 外部	1	外壁	外壁塗材

⑥ 機械室 竣工年不明（分析 2 検体、みなし含有候補 0 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	機械室	1	内部	保温材
2	機械室	1	外壁、屋根	外壁塗材

⑦ 外部トイレ 竣工年 1986 年（分析 2 検体、みなし含有候補 2 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	⑦外部トイレ 外部	1	屋根 軒裏	発砲ポリエチレン
2	⑦外部トイレ 男・女便所	1	内壁・外壁	アクリルリシン
3	⑦外部トイレ 女便所	1	天井	化粧石膏ボード
4	⑦外部トイレ 男便所	1	天井※補修箇所	化粧石膏ボード

⑧ 倉庫 竣工年不明

分析対象無し

⑨ 倉庫 竣工年不明

分析対象無し

⑩ 倉庫 竣工年不明

分析対象無し

⑪ 用務員宿舎 竣工年 1988 年（分析 1 検体、みなし含有候補 1 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	用務員宿舎	1	床	長尺シート
2	用務員宿舎	1	軒裏	断熱材

⑫ 倉庫 竣工年不明（分析 0 検体、みなし含有候補 1 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	⑫倉庫	1	壁	石膏ボード

⑬ 倉庫 竣工年不明（分析 0 検体、みなし含有候補 1 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	⑬倉庫	1	壁	石膏ボード

⑭ ゴミ置場 竣工年不明

分析対象無し

⑮ 野外炊事場 竣工年 1986 年（分析 2 検体、みなし含有候補 0 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	野外炊事場	1	屋根	コロニアル
2	野外炊事場	1	屋根	アスファルトルーフィング

⑯ シャワー室 竣工年不明（分析 2 検体、みなし含有候補 2 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	シャワー室	1	天井	ボード
2	脱衣室	1	天井	石膏ボード
3	シャワー室	1	軒裏	断熱材
4	シャワー室		外壁	外壁塗材

⑰ 倉庫 竣工年不明

分析対象無し

⑱ 倉庫 竣工年不明

分析対象無し

⑲ 屋外教室兼食堂 竣工年不明（分析 2 検体、みなし含有候補 0 検体）

	部屋名	階	場所	建材
1	屋外教室兼食堂	1	屋根	コロニアル
2	屋外教室兼食堂	1	屋根	アスファルトルーフィング


⑳ キャビン 竣工年 1985 年 (分析 1 検体、**みなし含有候補 0 検体**)

	部屋名	階	場所	建材
1	キャビン	1	屋根	コロニアル

検体数合計 56 検体


検体内訳 要分析 38 検体

みなし含有候補 18 検体

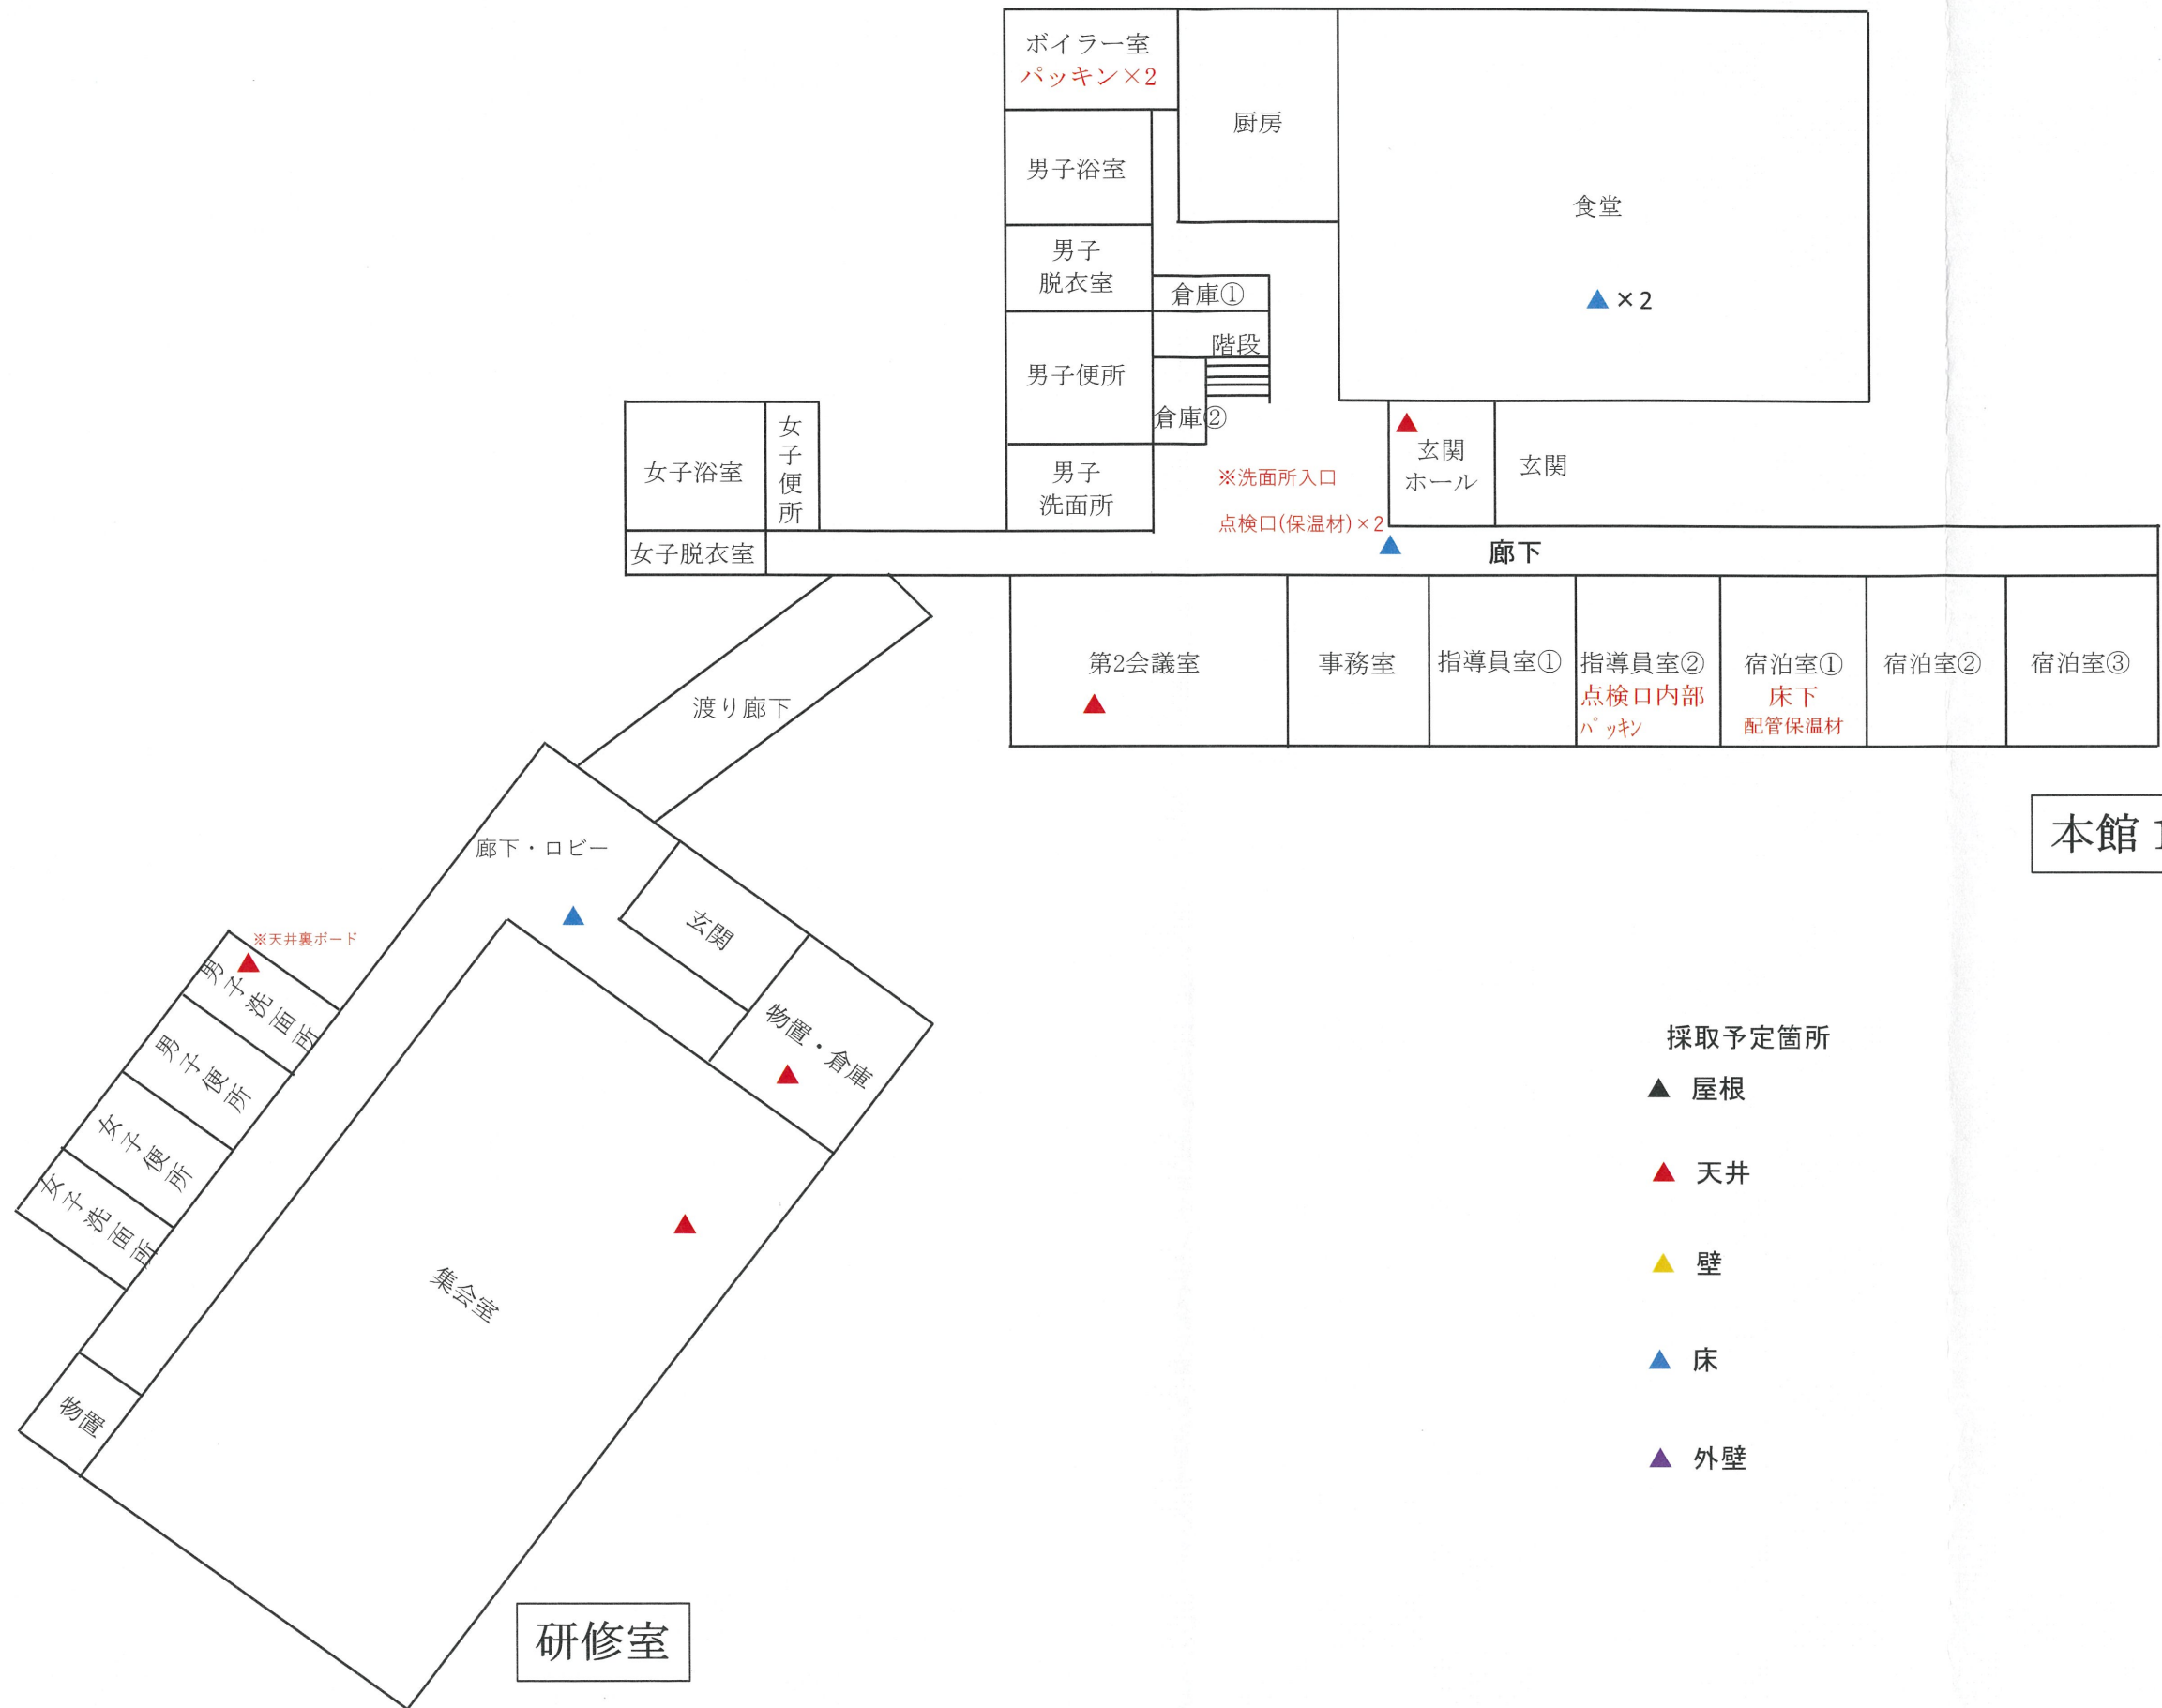

本館 1 階


- 採取予定箇所
- ▲ 屋根
 - ▲ 天井
 - ▲ 壁
 - ▲ 床
 - ▲ 外壁

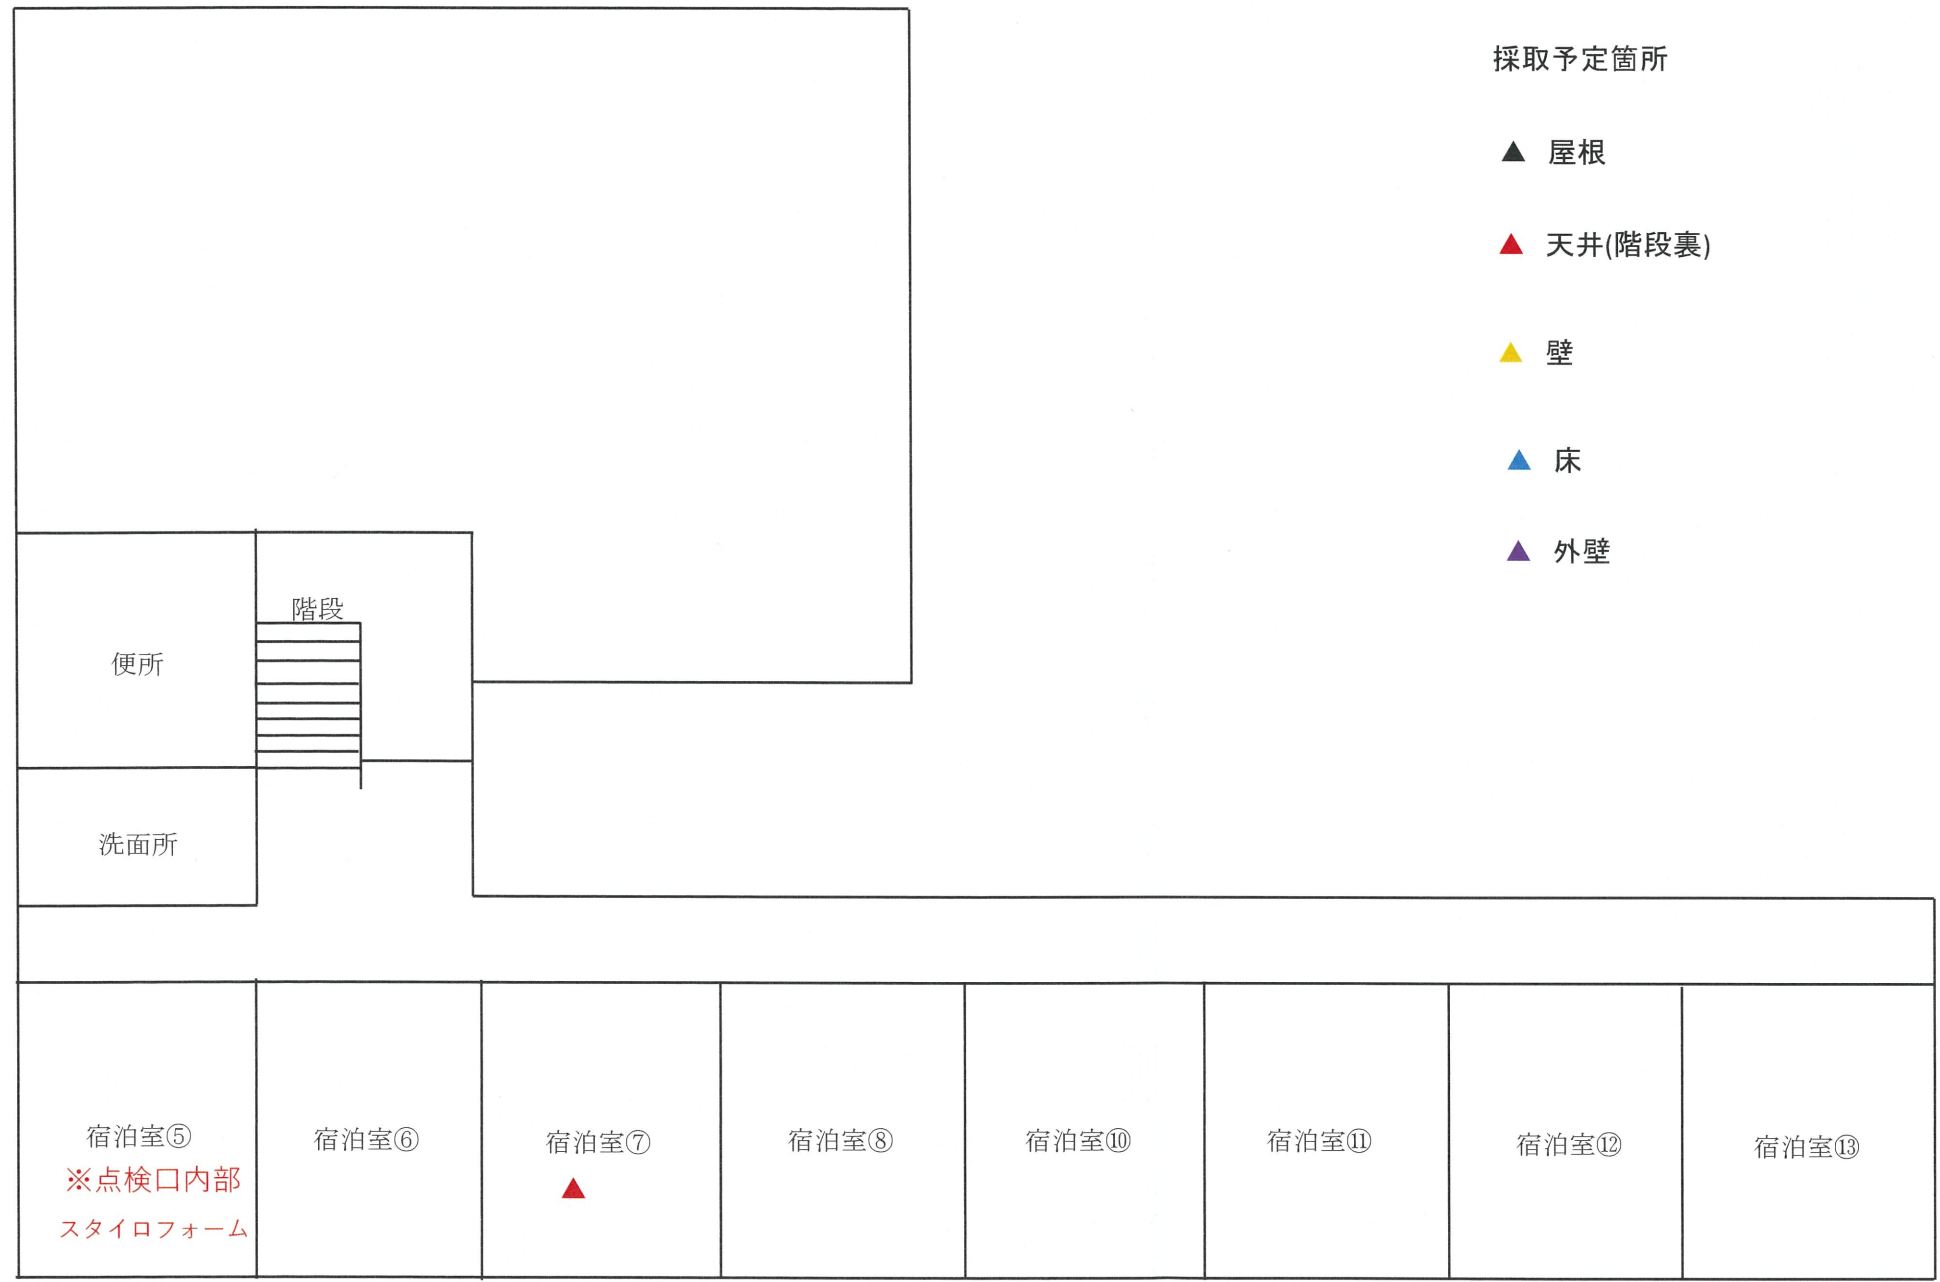

採取予定箇所


- ▲ 屋根
- ▲ 天井(階段裏)
- ▲ 壁
- ▲ 床
- ▲ 外壁

本館 2 階

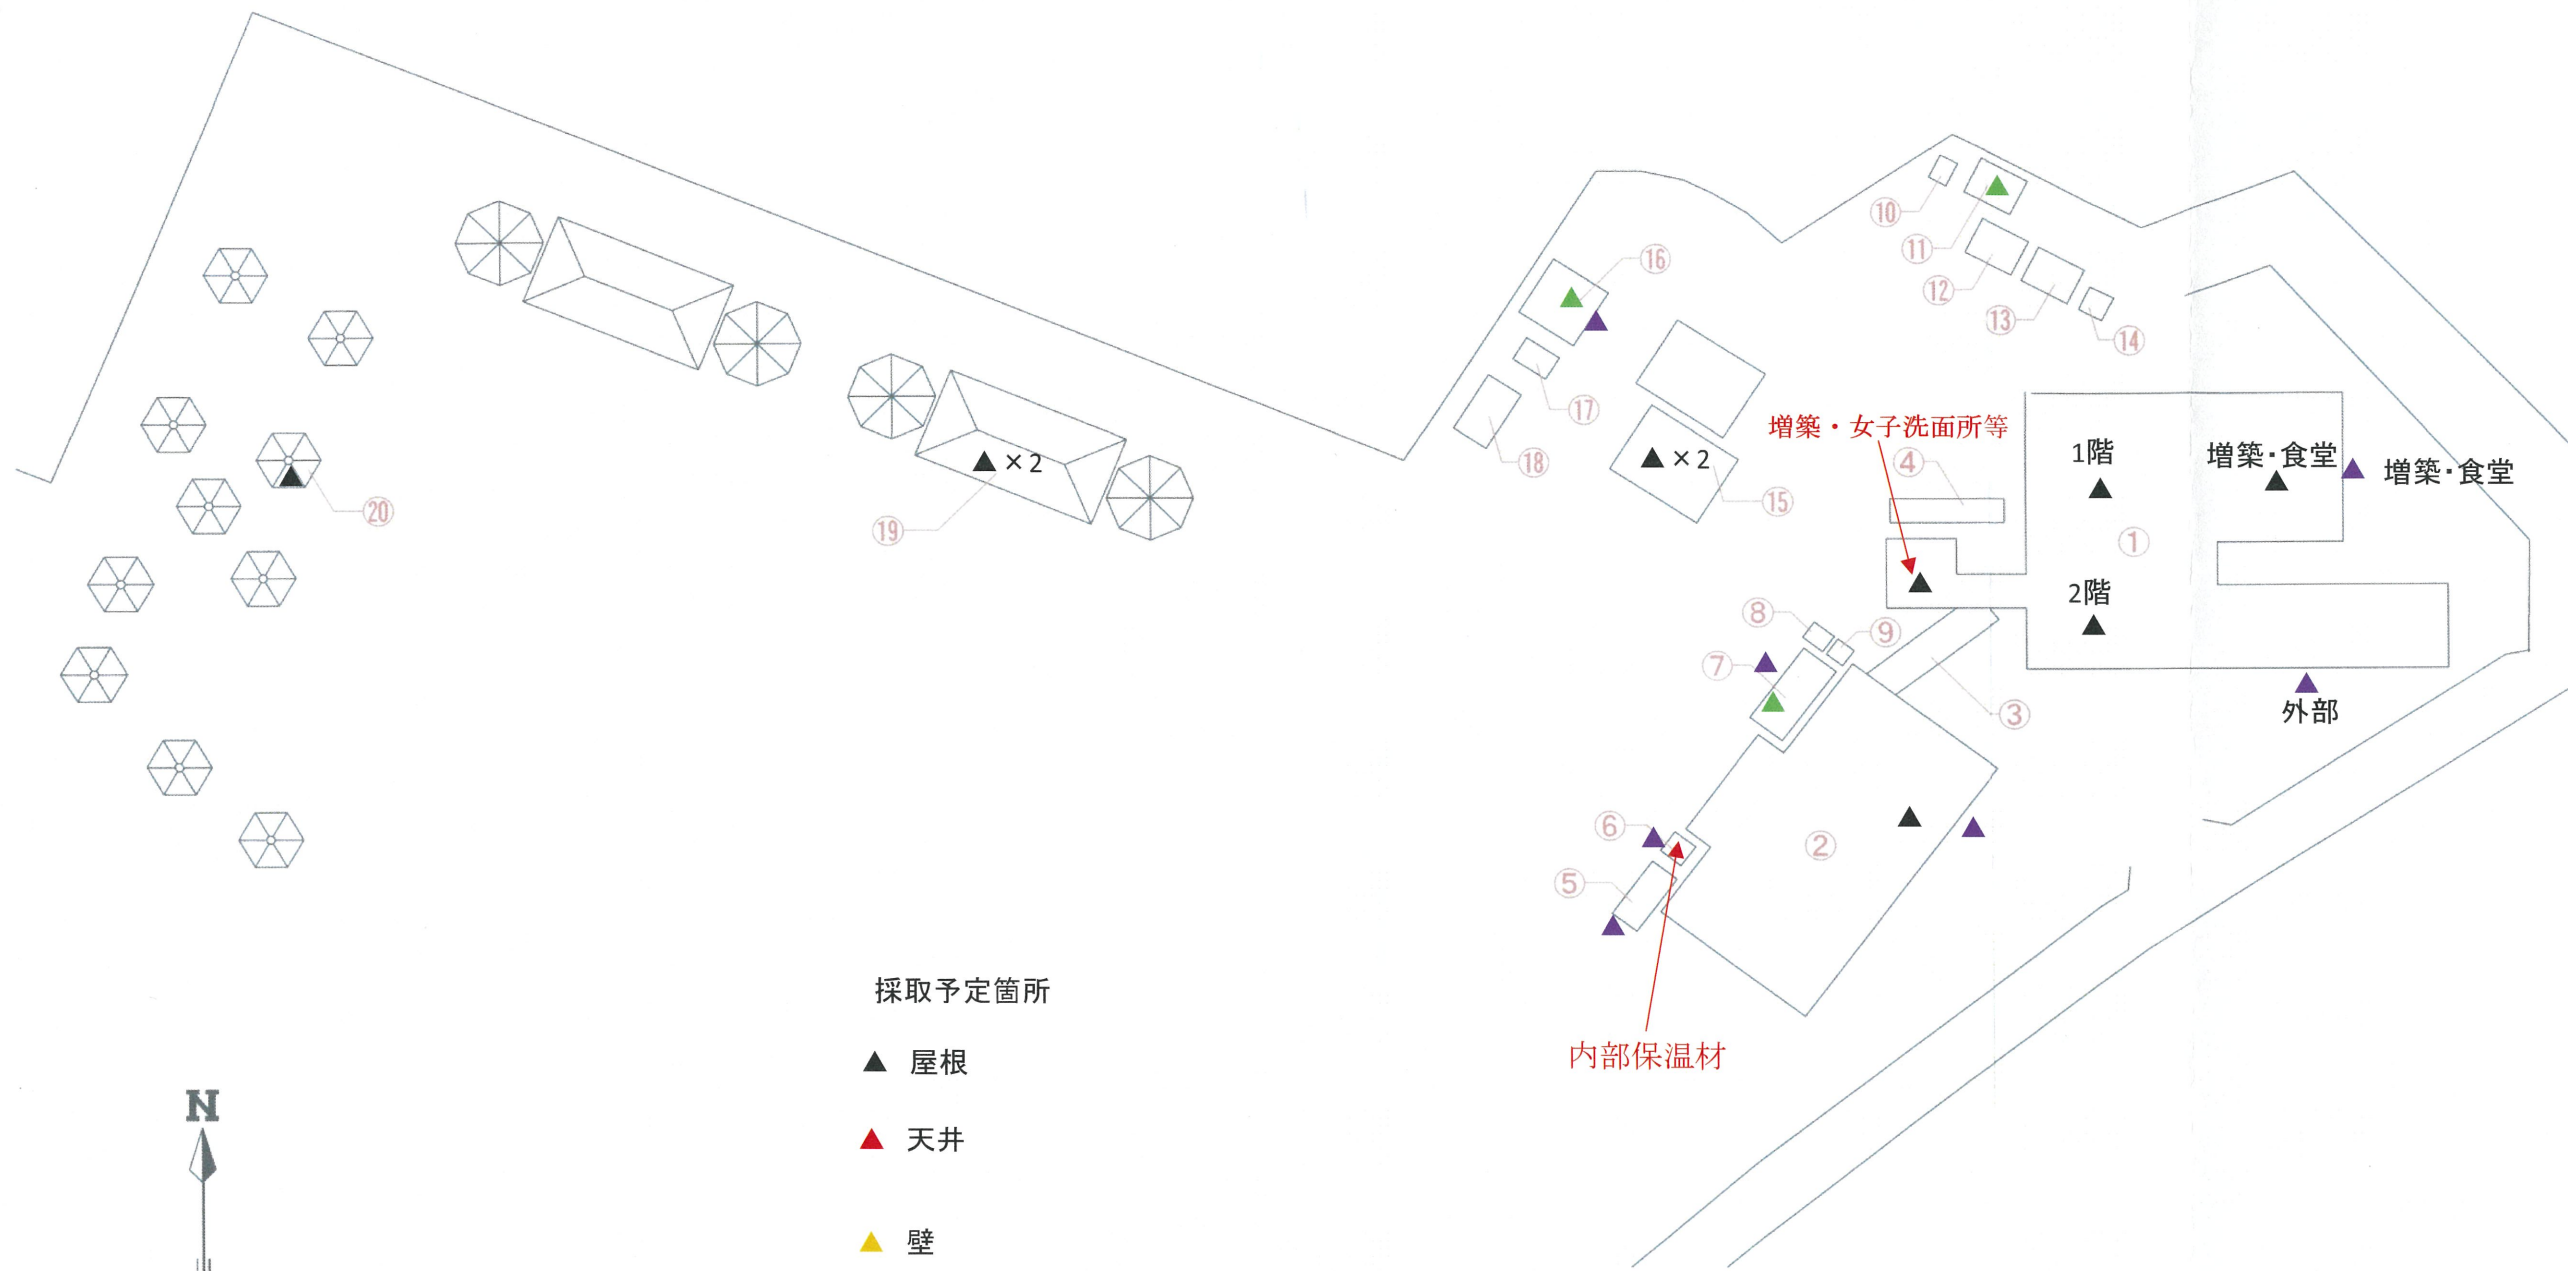

採取予定箇所

- ▲ 屋根
- ▲ 天井
- ▲ 壁
- ▲ 床
- ▲ 軒裏
- ▲ 外壁



建築物石綿含有建材調査結果表
(本館1階)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
1	玄関	床	人造石研出し
		巾木	人造石研出し
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	蛭石吹付
2	玄関ホール	床	ポリウム ピンク
		巾木	モルタル金ゴテ
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	蛭石吹付
3	階段	床	ポリウム ピンク
		巾木	モルタル金ゴテ
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	蛭石吹付
4	第2会議室	床	カーペット敷き
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YNﾌﾟﾗｽﾀｰ
		天井	石膏ボード(旧) 排水管保温材白巻 (室内にも)
5	食堂	床	ポリウム 奥(増築) 明グレー ポリウム 手前 グレー
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	奥側(増築部) 合板 手前側 YNﾌﾟﾗｽﾀｰ
		天井	石膏ボード(旧) 点検口内部スタイロフォーム
6	宿泊室①	床	ポリウム ピンク タミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YNﾌﾟﾗｽﾀｰ
		天井	石膏ボード(旧)
7	宿泊室②	床	ポリウム ピンク タミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YNﾌﾟﾗｽﾀｰ
		天井	石膏ボード(旧)
8	宿泊室③	床	ポリウム ピンク タミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YNﾌﾟﾗｽﾀｰ
		天井	石膏ボード(旧)
9	指導員室①	床	ポリウム ピンク タミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YNﾌﾟﾗｽﾀｰ
		天井	石膏ボード(旧)
10	指導員室②	床	ポリウム ピンク タミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YNﾌﾟﾗｽﾀｰ
		天井	石膏ボード(旧)

建築物石綿含有建材調査結果表
(本館1階)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
11	宿泊室、指導員室	タンス	—
		押入	—
		床下	床下配管 保温材
		点検口	排水管保温材白巻 パッキン
12	事務室	床	フローリング カーペット敷き
		巾木	木製タタキ寄せ
		壁	プラスター塗※一部ラスボード下地
		天井	石膏ボード(旧)
13	男子脱衣室	床	ロリウム ピンク フローリング
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YNプラスター
		天井	ベニヤ目ス칸貼(オイルペイント)
14	男子浴室	床	磁器モザイクタイル 下地:モルタル下地
		壁	磁器タイル モルタル金ゴテ
		天井	磁器タイル モルタル金ゴテ
		—	—
15	男子便所	床	磁器モザイクタイル 下地:モルタル下地
		壁	磁器タイル YNプラスター
		天井	ボード
		—	—
16	男子洗面所	床	磁器モザイクタイル 下地:モルタル下地
		壁	磁器タイル YNプラスター
		天井	ボード
		入口 点検口	排水管保温材銀巻 排水管保温材白巻
17	厨房	床	グリンカータイル 下地:モルタル下地
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	コンクリート打ち放し プラスター塗
		その他	ダクトパッキン
18	ボイラー室	床	コンクリート打ち放し
		壁	コンクリート打ち放し
		天井	コンクリート打ち放し プラスター塗
		その他	配管パッキン白 配管パッキン肌色
19	倉庫①	床	コンクリート打ち放し
		壁	コンクリート打ち放し
		天井	コンクリート打ち放し
		—	—
20	倉庫②	床	コンクリート打ち放し
		壁	コンクリート打ち放し
		天井	コンクリート打ち放し
		—	—

建築物石綿含有建材調査結果表
(本館1階)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
21	廊下	床	ポリウム ピンク
		巾木	モルタル金ゴテ
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	蛭石吹付
22	中廊下	床	ポリウム ピンク
		巾木	モルタル金ゴテ
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	蛭石吹付
23	1階増築部廊下	床	コンクリート打ち放し 塗材
		巾木	木製
		壁	石膏ボード 合板 モルタル金ゴテ
		天井	ボード
24	女子脱衣室	床	ポリウム 黄色 カーペット敷き
		壁	YNﾌﾟﾗｽﾀｰ
		天井	ボード
		ー	ー
25	女子浴室	床	磁器モザイクタイル 下地:モルタル下地
		壁	磁器タイル モルタル金ゴテ
		天井	ボード
		ー	ー
26	女子便所	床	タイル貼り
		壁	ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗
		天井	ボード
		ー	ー

建築物石綿含有建材調査結果表

(本館2階,外部)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
1	階段	床	ロソリウム グレー 下地:モルタル下地
		巾木	塗材 モルタル金ゴテ
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	蛭石吹付
2	宿泊室⑤	床	ロソリウム グレー タタミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YN7°ラスター
		天井	石膏ボード(新)
3	宿泊室⑥	床	ロソリウム グレー タタミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YN7°ラスター
		天井	石膏ボード(新)
4	宿泊室⑦	床	ロソリウム グレー タタミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YN7°ラスター
		天井	石膏ボード(新)
5	宿泊室⑧	床	ロソリウム グレー タタミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YN7°ラスター
		天井	石膏ボード(旧)
6	宿泊室⑩	床	ロソリウム グレー タタミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YN7°ラスター
		天井	石膏ボード(旧)
7	宿泊室⑪	床	ロソリウム グレー タタミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YN7°ラスター
		天井	石膏ボード(旧)
8	宿泊室⑫	床	ロソリウム グレー タタミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YN7°ラスター
		天井	石膏ボード(新)
9	宿泊室⑬	床	ロソリウム グレー タタミ張り
		巾木	木製(オイルペイント)
		壁	YN7°ラスター
		天井	石膏ボード(新)
10	宿泊室	床下	—
		点検口	点検口内部スタイロフォーム
		—	—
		—	—

建築物石綿含有建材調査結果表
(本館2階,外部)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
11	洗面所	床	磁器モザイクタイル ラスモルタル押工下地アスファルト防水
		壁	磁器タイル YN7 [※] ラスター
		天井	ベニヤ目スカン貼(オイルペイント)
		—	—
12	便所	床	磁器モザイクタイル ラスモルタル押工下地アスファルト防水
		壁	磁器タイル YN7 [※] ラスター
		天井	ベニヤ目スカン貼(オイルペイント)
		—	—
13	廊下	床	ポリウム グレー 下地:モルタル下地
		巾木	塗材 モルタル金ゴテ
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	蛭石吹付
14	本館外部	1階部分屋根	防水シート
		2階部分屋根	防水シート
		食堂増築部屋根	防水シート
		女子洗面所増築部屋根	防水シート
15	本館外部	外壁	外壁塗材
		食堂増築部外壁	外壁塗材
		女子洗面所増築部外壁	コンクリート打ち放し
		外階段	鉄骨造
16	本館外部	煙突	カボスタック コンクリート製
		樋・笠樋	ルーフトレーン 構造用鋼索
		ポーチ庇裏	コンクリート製 打ち放し 白セメント吹付
		ポーチ庇	モルタル防水
17	本館外部	トップライト	—
		外観	—
		—	—
		—	—

建築物石綿含有建材調査結果表
(研修室)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
1	玄関	床	コンクリート打ち放し
		巾木	テラゾー(ブロッグ)
		壁	木品合板㊦5.5 OP(オイルペイント)
		天井	石膏ボード(旧)
2	廊下・ロビー	床	Pタイル(濃い) コンクリート土間
		床	Pタイル(薄い) コンクリート土間
		巾木	ラワンOP(オイルペイント)
		壁	木品合板㊦5.5 OP(オイルペイント)
3	廊下・ロビー	天井	石膏ボード(新) 石膏ボード(旧)
		その他	天井裏内部ボード
		—	—
		—	—
4	集会室	床	耐水ペニヤ グラフロリング 樹脂塗装
		巾木	ラワンOP(オイルペイント)
		壁	木品合板㊦5.5 OP(オイルペイント)
		天井	石膏ボード(新)
5	物置・倉庫	床	耐水ペニヤ
		巾木	ラワンOP(オイルペイント)
		壁	木品合板㊦5.5 OP(オイルペイント)
		天井	石膏ボード(旧)
6	男子洗面所	床	O.I.Cカーペット敷
		巾木	ラワンOP(オイルペイント)
		壁	磁器タイル 木品合板㊦5.5 OP(オイルペイント)
		天井	石膏ボード(旧) 天井裏内部ボード
7	男子便所	床	磁器モザイクタイル
		壁	磁器タイル
		天井	大平板 5.0
		—	—
8	女子洗面所	床	O.I.Cカーペット敷
		巾木	ラワンOP(オイルペイント)
		壁	磁器タイル 木品合板㊦5.5 OP(オイルペイント)
		天井	石膏ボード(旧)
9	女子便所	床	磁器モザイクタイル
		壁	磁器タイル
		天井	大平板 5.0
		—	—
10	研修室外部	屋根	クボタカラーベストコロニアル
		軒樋	化粧箱樋 オリエンタルメタル
		軒裏	ビードリング貼
		外壁	ALC板(軽量気泡コンクリート) アクリルシロ吹付、一部ラスメタル

建築物石綿含有建材調査結果表
(研修室)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
11	研修室外部	柱型	アクリルシン吹付 ラスモルタル
		梁型	ジュラクロン
		建具	アルミサッシ
		テラス	モルタル金ゴテ

建築物石綿含有建材調査結果表
(附属建物)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
1	渡り廊下	外観	—
		屋根	鉄板
		床	ポリウム 赤色 コンクリート金ゴテ
		天井	合板
2	駐輪場	外観	屋根 カラー鉄板
		—	—
		—	—
		—	—
3	外部トイレ⑤ 外部	外観	—
		屋根	鉄板
		外壁	外壁塗材
		—	—
4	外部トイレ⑤ 内部	床	コンクリート打ち放し
		壁	モルタル金ゴテ
		天井	石膏ボード (附属建物)
		—	—
5	機械室	外観	屋根：吹付塗材
		外壁	吹付塗材
		—	—
		—	—
6	機械室	床	コンクリート打ち放し
		壁	保温材 ブロック塀
		天井	保温材
		—	—
7	外部トイレ⑦外部	外観	—
		軒樋・堅樋	軒樋:塩ビ角樋150(IV)×120(H) 堅樋:VP 100Φ
		外壁	アクリルシン吹付 モルタル金ゴテ
		—	—
8	外部トイレ⑦外部	屋根	折版屋根t:0.8 H:173 カラー鉄板
		屋根・軒裏	発泡ポリエチレン
		—	—
		—	—
9	外部トイレ⑦内部	床	コンクリート打ち放し
		巾木	コンクリート打ち放し
		壁	アクリルシン吹付 シーラー
		天井	石膏ボード (附属建物)
10	倉庫⑧	外観	スチール
		内部	—
		—	—
		—	—

建築物石綿含有建材調査結果表
(附属建物)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
11	倉庫⑨	外観	スチール
		内部	—
		—	—
		—	—
12	倉庫⑩	外観	スチール
		内部	—
		—	—
		—	—
13	用務員宿舎	外観	—
		屋根	鉄板
		軒裏	断熱材
		—	—
14	用務員宿舎	床	長尺シート フローリング*
		巾木	木製
		壁	木製
		天井	合板
15	倉庫⑫	外観	スチール
		屋根	鉄板
		—	—
		—	—
16	倉庫⑫	床	コンクリート打ち放し
		壁	石膏ボード* (附属建物)
		天井	木製
		—	—
17	倉庫⑬	外観	スチール
		屋根	鉄板
		—	—
		—	—
18	倉庫⑬	床	コンクリート打ち放し
		壁	石膏ボード* (附属建物)
		天井	木製
		—	—
19	ゴミ置場	外観	—
		—	—
		—	—
		—	—
20	野外炊事場	外観	—
		屋根	コニアル葺き アスファルトルーフィング 22K
		—	—
		—	—

建築物石綿含有建材調査結果表
(附属建物)

No.	部屋名	施工部位	設計図書及び現地調査結果
21	シャワー室	外観	—
		屋根	鉄板
		軒裏	断熱材
		外壁	外壁塗材
22	シャワー室(男子)	床	磁器タイル
		巾木	モルタル金ゴテ
		壁	磁器タイル
		天井	ポート
23	シャワー室(女子)	床	磁器タイル
		巾木	モルタル金ゴテ
		壁	磁器タイル
		天井	ポート
24	シャワー室(脱衣室)	床	コンクリート打ち放し
		壁	プーラスター塗
		天井	石膏ポート(附属建物)
		—	—
25	倉庫⑰	外観	スチール
		内部	—
		—	—
		—	—
26	倉庫⑱	外観	スチール
		内部	—
		—	—
		—	—
27	屋外教室兼食堂	外観	—
		屋根	コロニアル葺き アスファルトルーフィング 22K
		—	—
		—	—
28	キャビン	外観	—
		屋根	コロニアル
		内部	床:木製, 壁:木製, 天井:木製
		—	—
